


Прошу выполнить футеровку вытяжного канала по технологии ФУРАНФЛЕКС.

Местонахождение объекта (населенный пункт, адрес, телефон)

телефон _____

Параметры объекта:

1.	Длина дымохода		метр
2.	Диаметр отверстия котла (колонки)		мм
3.	Сечение канала	х	мм х мм
4.	Высота дымохода над крышей		метр
5.	Высота крыши (справочно)		метр
6.	Возможность добраться до верхушки дымохода (лестница, вышка, другое) - указать!		
7.	Подключаемое оборудование (котел, камин, колонка) - указать!		

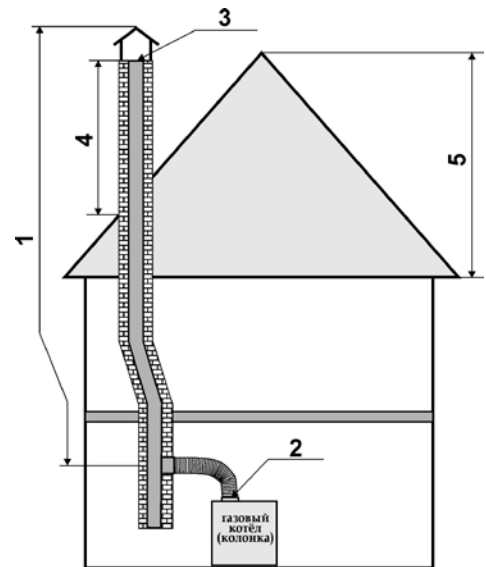

С условиями выполнения заказа, а именно:

1. При приблизительно указанной длине канала фактически используемый материал будет пересчитываться перед выполнением работ.
2. Если труба ФУРАНФЛЕКС заявленного диаметра отсутствует на складе, поставка материала осуществляется под заказ и точной длины.
3. Диаметр трубы ФУРАНФЛЕКС должен быть равен или больше диаметра выходного отверстия подключаемого оборудования.
4. **ВАЖНО!** Площадь поперечного сечения газоотводящего канала должна быть равна или больше площади поперечного сечения газоотводящего патрубка отопительного прибора.
5. В случае применения одного канала для газоотвода от двух котлов, поперечное сечение газоотводящего канала должно быть равно или больше суммы сечений газоотводящих патрубков обоих котлов. Расстояние по вертикали между точками входа от котлов одна от другой не менее 700 мм.
6. При нарушении условий пп.4,5 не гарантируется нормальная работа отопительных приборов!
7. При наличии над газоотводящим каналом козырька, возможно образование сосулек, выпадение дождя из под козырька на дымоход, канал должен открываться просто в небо.
8. Заказ принимается к выполнению после подтверждения расчета, предоплаты и согласования срока выполнения работ.

ФОРМА РАСЧЕТА:

1. Предоплата 1000 грн. на счет или банковскую карточку.
2. **Оплата остатка - после точного замера и перерасчета перед началом монтажа.**
3. Срок выполнения работ – 1,5 – 2 недели после поступления предоплаты.
4. Предоплата является подтверждением выполнения работы и постановки заказа в график работ.
5. Оплата производится в грн.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. По технологии ФУРАНФЛЕКС необходимо вскрытие канала высотой 40-50 см по ширине канала в месте подключаемого оборудования.
2. Отвод конденсата и заделку стен заказчик выполняет самостоятельно.
3. Повреждения дымохода бригада не восстанавливает, а только футерует канал изнутри.

ознакомлен и согласен.

Оплату по счету гарантирую.

" ____ " _____ г.

ПОДПИСЬ _____
